



230100, Nukus shahri, Dosnazarov ko'chasi, 62-uy
Tel.: 0 (361) 222-24-37, 222-95-20, faks: 222-98-30
web-site: www.kkedu.uz, e-mail: mno.rk@exat.uz

230100, Nökis qalasi, Dosnazarov kóshesi 62-úy
Tel.: 0 (361) 222-24-37, 222-95-20, faks: 222-98-30
web-site: www.kkedu.uz, e-mail: mno.rk@exat.uz

« 23 » июль 2021-у.

№ 03-04/03-3402 « _____ »- _____ 2021-ж.

Қарақалпақстан Республикасы
Министрлер Кеңесине

Сизиң 2021-жыл 2-июльдеги Қ-261-санлы хатыңызға:

Сизиң, «TUNGISH IMARAT SERVIS» профессионал басқаруы компаниясы жууапкершилиги шекленген жәмийети директоры Д.Қудайназаровтың 2021-жыл 29-июньда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине жоллаған мүрәжаты бойынша:

2018-2019-оқыў жылы ушын тест сынаўларын өткерийўге таярлық жумыслары барысында ҳақыйқатында Д.Қудайназаров басқарған «TUNGISH IMARAT SERVIS» профессионал басқаруы компаниясы жууапкершилиги шекленген жәмийети тәрәпинен Нөкис қаласы «Айдын жол» мәкан пуқаралар жыйыны Шымбай гузары 17-жайда жайласқан 5-санлы улыўма орта билим берийў мектебинде қурылыс-оңлаў жумыслары алып барылған лекин, қаржы дереклери анықланбағанлығы себепли 2 тәрәплеме шәртнама дүзилмеген.

Бул бойынша Нөкис қалалық халық билимлендирийў бөлимниң 2020-жыл 4-февральдағы 01-01/5-229-санлы ҳәм 2020-жыл 29-октябрьдеги 01-01/5-1655-санлы қатнас хатлары менен Нөкис қаласы Хәкимлигине қаржыландырийў дерегин анықлаў бойынша мүрәжат етилгенлигин мәлим етип билдиремиз.

Қосымша: _____ бетте.

Министр орынбасары

Ш.Таджимуратов





Nukus shahri 230100. Sh.Abdirov ko'shasi 2 joy
Tel: 8 (361) 226-15-11.

faks: (3-861 226-15-11)
Email- nukus_shxtb@xtv.uz

No'kis qalasi 230100. Sh.Abdirov ko'shasi 2 joy
Tel: 8 (361) 226-15-11.

« 4 » февраль 2020-жыл

01-01/5- 229

Нөкис қаласы Хәкими
П.Турешевқа

Көширмеси:

Қарақалпақстан Республикасы
Халық билимлендириў министри
А.Аяповқа

Нөкис қалалық Халық билимлендириў бөлими Сизден, бөлимге қараслы Нөкис қаласы «Айдын жол» мекен пуқаралар жыйыны Шымбай гузары 17-жайда жайласқан 5-санлы улыўма орта билим бериў мектеби имаратына 2018-жыл мәмлекетлик тест сынаўларын өткериў барысында билимлендириў мәкемеси имаратына әмелге асырылған қурылыс-оңлаў жұмыслары ушын 37 436 710,0 (Отыз жети миллион төрт жүз отыз алты мың жети жүз он) сум хәмде 2020-жыл жергиликли қаржы есабынан мектеп имаратының ески ағаш айналарын жаңа заманагөй пластик айналарға алмастырыў қурылыс-оңлаў жұмысларына 136 607 930,0 (Бир жүз отыз алты миллион алты жүз жети мың тоғыз жүз отыз) сум қаржы ажыртыўда әмелий жәрдем бериўиңизди соранаман.

Қосымша: 6 бетте

Нөкис қалалық Халық
билимлендириў бөлими баслығы:

К.Уматов

Орынлаўшы: Ж.Қосбергенов
Тел (факс): (+99861) 226-18-06



« 29 » oktyabr 2020-жыл

01-01/5- 1855

Ноқис қаласы Хәкими
П.Турешевқа

2018-2019-жыллар жоқары оқыў орынларына талабаларды қабыллаў мәмлекетлик тест сынақларын өткеріў ушын Ноқис қалалық Халық билимлендириў бөлиминде қарасты Ноқис қаласы "Айдын жол" мәкан пуқаралар жыйыны Шымбай гузары 17-имаратта жайласқан 5-санлы улыўма орта билим беріў мектеби имараты талабалардың ата-аналары хәм жақынларының күтиў орны етип белгиленген еди.

Мәмлекетлик тест сынақларын өткеріў бойынша таярлық жұмыслары барысында 5-санлы улыўма орта билим беріў мектеби имаратының фасад ремонты хәм фасад тәрепи ески ағаш айналарын заманағой пластик айналарға алмастырыў ушын «Нукусгорландшафтпроект» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен мектеп фасады ремонты ушын 42,5 млн сўм, пластик айналарды орнатыў ушын 152,2 млн сўмға қурылыс-оңлаў жұмыслары смета хўжеттери ислеп шығылып, қурылыс-оңлаў жұмыслары «Тунғыш имарат Сервис» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен толық әмелге асырылғанлығы менен 2018-2020-жыллар даўамында қаржы болмағанлығы себепли әмелге асырылған қурылыс-оңлаў жұмыслары ушын есапласыў имканияты болмады.

Жоқарыдағыларды есапқа алып Сизден, бөлимге қарасты 5-санлы улыўма орта билим беріў мектеби имаратына әмелге асырылған қурылыс-оңлаў жұмыслары ушын 2020-жылдағы базар бақаларын есапқа алған халда «Нукусгорландшафтпроект» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен мектеп фасады ремонты ушын 38 709 430 млн сўм, пластик айналарды орнатыў ушын 155 383 110,0 млн сўм, жәми 194 092 540,0 (Бир жүз тоқсан төрт миллион тоқсан еки мың бес жүз қырық) сўмға қайтадан исленген қурылыс-оңлаў жұмыслары смета хўжеттери тийкарында жергиликли қаржы есабынан қаржы ажыратыў ушын шешим қабыллаўда әмелий жәрдем беріўиңизди соранаман.

Қосымша: 22 - беттен ибарат.

2018, 2019, 2020-жыллар даўамында «Нукусгорландшафтпроект» ЖШЖ тәрепинен ислеп шығылған қурылыс-оңлаў жұмыслары смета хўжеттери нұсқалары қосымша етиледі.

Ноқис қалалық Халық
билимлендириў бөлими баслығы:

П.Ақназаров

Орынлаушы: Т.Жамуратов
Тел (факс): (+99861) 226-18-06

Общество с ограниченной ответственностью


"Нукусгорландшафтпроект"



Рабочий проект

**Расчет стартовой стоимости строительства в текущих ценах
по объекту:**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №-5 ПО УЛИЦЕ ШЫМБАЙ ЖОЛЫ ГУЗАРЫ В ГОРОДЕ НУКУС (ЗАМЕНА
ОКОННЫХ БЛОКОВ)**

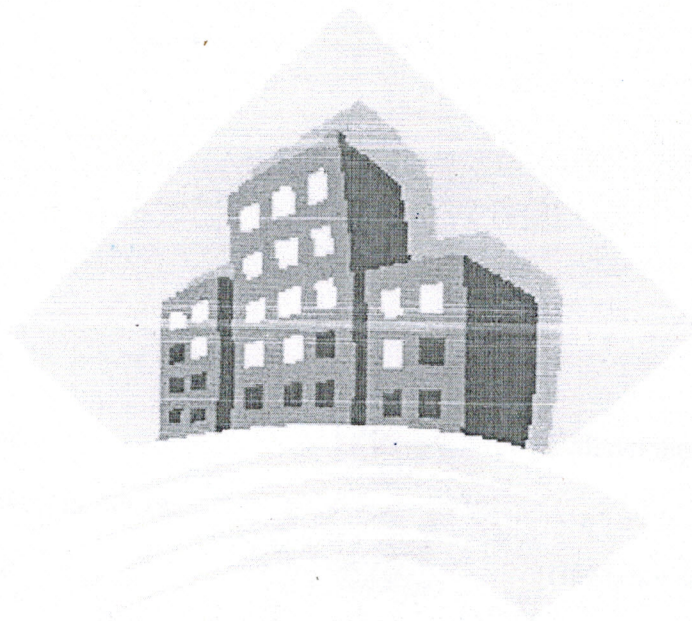

г.НУКУС-2020

ООО "Нукусгорландшафтпроект"

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №-5 ПО УЛИЦЕ ШЫМБАЙ ЖОЛЫ ГУЗАРЫ В ГОРОДЕ НУКУС (ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ)

Расчет стоимости строительства в рекомендуемых текущих ценах,
ресурсная смета и локальная ресурсная ведомость.

Директор:

Гл. инженер проекта:

Проверил:

Составил:



Пайзуллаев Б

Аметов Б.

Пайзуллаев Б.

Сайтбекова Г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определения расчетной стоимости строительства в договорных текущих ценах
объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №-5 ПО УЛИЦЕ ШЫМБАЙ ЖОЛЫ ГУЗАРЫ В ГОРОДЕ НУКУС (ЗАМЕН ОКОННЫХ БЛОКОВ)

Ориентировочная стоимость строительства объекта определена в соответствии с порядком установленным постановлением Кабинета Министров от 11 июня 2003 года № 216, ШНК 4. 01. 16-09. «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30 июля 2009 года № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года №39.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев от июля 2018 по июнь 2019 г. по Республике Каракалпакстан, согласно по данным Управления статистики Республики Каракалпакстан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве. информационный "Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы с информационно-аналитическим приложением за 2-квартал 2020 г. а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже). Программный комплекс TNQurilish 4.6

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификации с применением цен предприятий - производителей (поставщиков) или по банку данных, сформированному на основании мониторинга цен

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласны ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта.


Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика

Ориентировочная стоимость :

в текущих ценах без НДС составляет	131835,58	тыс.сум.
в текущих ценах с учетом НДС и затрат заказчика составляет	155383,11	тыс.сум.

Составил:  Сайтбекова Г

Проверил:  Пайзуллаев Б

**Определение стоимости объекта
в рекомендуемых текущих ценах:**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №-5 ПО УЛИЦЕ ШЫМБАЙ ЖОЛЫ ГУЗАРЫ В ГОРОДЕ НУКУС (ЗАМЕН
ОКОННЫХ БЛОКОВ)**

Согласно данным Управления статистики РК сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей по Республике за 12-месяцев 2019 г. составила 2308462,067 сум.

Количество рабочих часов в месяц на 2019 г год – 166,917
 Часовая ставка - Сч= 2308462,1 : 166,917 = 13830,00 сум/час

Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = 742,20 чел/час
 Основная заработная плата рабочих-строителей: Сзп = 742,20 x 13830,00 = 10264,69 тыс. сум


Отчисление на социальное страхование 12% : 10264,69 x 12 = 1231,76 тыс. сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила: 10264,69 + 1231,76 = 11496,45 тыс. сум

№	Наименование Объекта	Затраты труда раб. строителей чел-час З/плата с отчислен. тыс.сум	Строительные машины и механизмы тыс.сум	Строительные материалы и конструкции тыс.сум	Оборудование тыс.сум	Транспорт грунта	Итого прямых затрат тыс.сум
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01-01 Ремонтно-строительные работы	742,20 11496,45	344,77	92600,94			104442,16
	ИТОГО	742,20 11496,45	344,77	92600,94			104442,16
	А.Транспортные расходы						
	а) стройматериалы 5%			4630,05			4630,05
	ИТОГО	742,20 11496,45	344,77	97230,98			109072,21
	Прочие затраты подрядчика			109072,21			
	ИТОГО				x	0,2087	22763,37
	НДС 15%						131835,58
	ИТОГО С НДС						19775,34
	Прочие затраты заказчика						151610,91
						ПИР	3272,17
						ЭКСПЕРТИЗА	500,03
						ИТОГО	3772,20
							155383,11

Составила: _____ Сайтбекова Г

Проверил: _____ Пайзуллаев Б




НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №-5 ПО УЛИЦЕ ШЫМБАЙ ГУЗАРЫ В ГОРОДЕ НУКУСЕ
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-01
 НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	742,20464	15 489,60	11 496 453
			ИТОГО				11 496 453
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	01157	C226-1400	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	1,5317	1 676,00	2 567
2	02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16137	54 548,00	8 802
3	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,11211	54 548,00	333 403
			ИТОГО	СУМ			344 773
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	12138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1467	359 242,00	52 701
2	12147	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	6,3081	487 450,00	3 074 883
3	30884		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	162,3	460 000,00	74 658 000
4	35538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,23228	35 000,00	43 130
5	43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,026993	15 800 000,00	426 489
6	51475	C123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ БЕЛЫЙ ШИРИНОЙ 300 ММ	М	106,3	44 900,00	4 772 870
7	80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	245,458	39 000,00	9 572 862
			ИТОГО	СУМ			92 600 936
			ИТОГО	СУМ			104 442 181

Составил:  Сайтбекова Г

Проверил:  Пайзуллаев Б


НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №-5 ПО УЛИЦЕ ШЫМБАЙ ГУЗАРЫ В ГОРОДЕ НУКУСЕ


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-01

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,53	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	68,2269
1.2	01157	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	2,89	1,5317
2	E10-1-34-1	МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100М2	1,623	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	170,75	277,12725
2.2	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	5,79411
2.3	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	162,3
2.4	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	92	149,316
3	E10-1-35-3	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100М	1,06	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,38	22,6628
3.2	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,3	0,318
3.3	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	90,7	96,142
4	C123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ БЕЛЫЙ ШИРИНОЙ 300 ММ	М	106,3	
5	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ ВНУТРЕННИХ	100М2	1,487	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	299,35602
5.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,1487
5.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	6,3081
6	E15-4-25-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100М2	1,487	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	74,83167
6.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,16137
6.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,23228
6.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0184	0,026993

Составил:  Сайтбекова Г

Проверил:  Пайзуллаев Б

Общество с ограниченной ответственностью

"Нукусгорландшафтпроект"



Рабочий проект

**Расчет стартовой стоимости строительства в текущих ценах
по объекту:**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №-5 ПО УЛИЦЕ ШЫМБАЙ ЖОЛЫ ГУЗАРЫ В ГОРОДЕ НУКУС (РЕМОНТ
ФАСАДА)**



г.НУКУС-2020


ООО "Нукусгорландшафтпроект"

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №-5 ПО УЛИЦЕ ШЫМБАЙ ЖОЛЫ ГУЗАРЫ В ГОРОДЕ НУКУС (РЕМОНТ ФАСАДА)

Расчет стоимости строительства в рекомендуемых текущих ценах,
ресурсная смета и локальная ресурсная ведомость.

Директор:




Пайзуллаев Б.

Гл. инженер проекта:




Аметов Б.

Проверил:



Пайзуллаев Б.

Составил:



Сайтбекова Г.

г.НУКУС 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определения расчетной стоимости строительства в договорных текущих ценах
объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №5 ПО УЛИЦЕ ШЫМБАЙ ЖОЛЫ ГУЗАРЫ В ГОРОДЕ НУКУС (РЕМОТ ФАСАДА)

Ориентировочная стоимость строительства объекта определена в соответствии с порядком установленным постановлением Кабинета Министров от 11 июня 2003 года № 216, ШНК 4.01.16-09. «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30 июля 2009 года № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года №39.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев от июля 2018 по июнь 2019 г. по Республике Каракалпакстан, согласно по данным Управления статистики Республики Каракалпакстан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве. информационный "Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы с информационно-аналитическим приложением за 2-квартал 2020 г. а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже). Программный комплекс TNQurilish.4.6

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификации с применением цен предприятий - производителей (поставщиков) или по банку данных, сформированному на основании мониторинга цен.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика

Ориентировочная стоимость :

в текущих ценах без НДС составляет	32759,90	тыс.сум.
в текущих ценах с учетом НДС и затрат заказчика составляет	38709,43	тыс.сум.

Составил: _____ Сайтбекова Г

Проверил: _____ Пайзуллаев Б



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №-5 ПО УЛИЦЕ ШЫМБАЙ ГУЗАРЫ В ГОРОДЕ НУКУСЕ
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕМОНТ ФАСАДА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-01
 НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1071,74493	15 489,60	16 600 900
			ИТОГО				16 600 900
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,501156	54 548,00	136 433
			ИТОГО	СУМ			136 433
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	31700	C111-1375	ШПАТЛЕВКА "РОКБОНТ"	Т	1,9	1 000 000,00	1 900 000
2	31752	C111-1547	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	Т	0,885535	6 200 000,00	5 490 317
3	35512	C111-639	ГЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00044	33 350,00	15
4	44082	C112-9084	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,116715	2 600 000,00	303 459
5	63944	C113-9231	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,45389	4 800 000,00	2 178 672
			ИТОГО	СУМ			9 872 483
			ИТОГО	СУМ			28 609 796

Составил:  Сайтбекова Г

Проверил:  Пайзуллаев Б



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №-5 ПО УЛИЦЕ ШЫМБАЙ ГУЗАРЫ В ГОРОДЕ НУКУСЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕМОНТ ФАСАДА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-01

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E62-41-2	ОЧИСТКА ОТ СТАРОЙ КРАСКОЙ СТЕН ФАСАДА И ЦОКОЛЯ	100М2	9,7423	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,87	252,033301
2	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН И ОТКОСОВ ЗА 2-РАЗА	100М2	8,2763	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	99,220847
2.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,248259
3	C111-1375	ШПАТЛЕВКА "РОКБОНТ"	Т	1,9	
4	E15-4-12-2	ОКРАСКА ФАСАДА И ЦОКОЛЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100М2	9,7423	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,95	135,905085
4.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	1,169076
4.3	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	Т	0,079	0,769642
5	E15-4-12-2	ОКРАСКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100М2	1,467	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,95	20,46465
5.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,17604
5.3	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	Т	0,079	0,115893
5.4	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0003	0,00044
6	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	12,9883	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	564,12105
6.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,907781
6.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,116715
6.4	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,453891

Составил:  Сайтбекова ГПроверил:  Пйазуллаев Б
